

I NUMERI DEL PNRR MISSIONE 6 NELLA ASL ROMA 2

22 CDC



31 Mln€

7 COT



0,8 Mln€

3 ODC



8,1 Mln€


6 SISMI



30,7 Mln€

Totale finanziamento
70,6 Mln€

IL PNRR NEL DISTRETTO IV

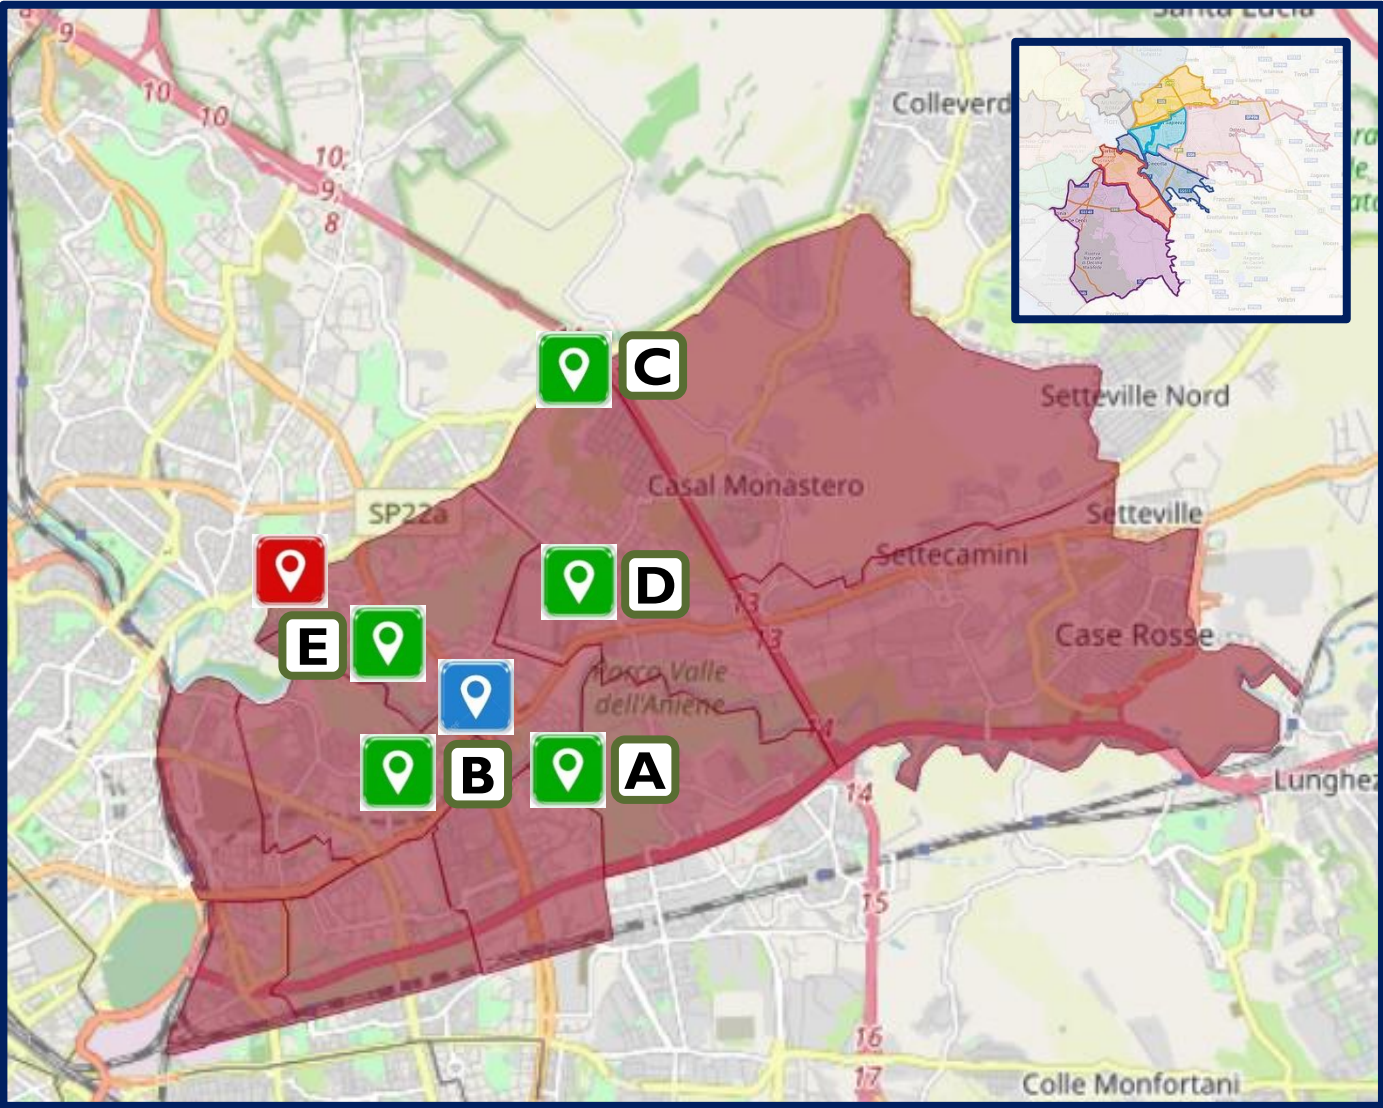

 OdC  CdC  COT

ODC Via del Frantoio 44 – 1140 mq

NEW

A CDC Via Mozart 25 – ATER – 815 mq

B CDC Via del Frantoio 44 – 840 mq

NEW

C CDC Via P. Bonifacio (Bimbilandia) – 1050 mq

NEW

D CDC Villa Tiburtina – 770 mq

NEW

E CDC Via Pietralata 497 – 1400 mq

NEW

COT Via del Peperino – 150 mq CONCLUSO

PRESIDIO TERRITORIALE	FINE LAVORI	Milestone PNRR
ODC Via del Frantoio	lug-25 	mar-26
CDC Via del Frantoio	mag-25 	mar-26
CDC Bimbilandia	giu-25 	mar-26
CDC Villa Tiburtina	lug-25 	mar-26
CDC Via Mozart	lug-25 	mar-26
CDC Via di Pietralata	apr-25	-



ANDAMENTO LAVORI IV DISTRETTO

ODC VIA DEL FRANTOIO

ANTE OPERAM



ANDAMENTO LAVORI

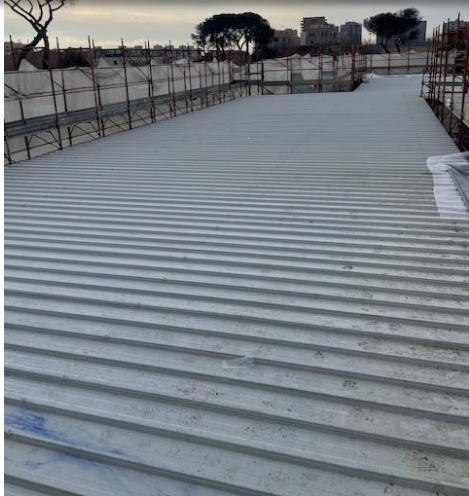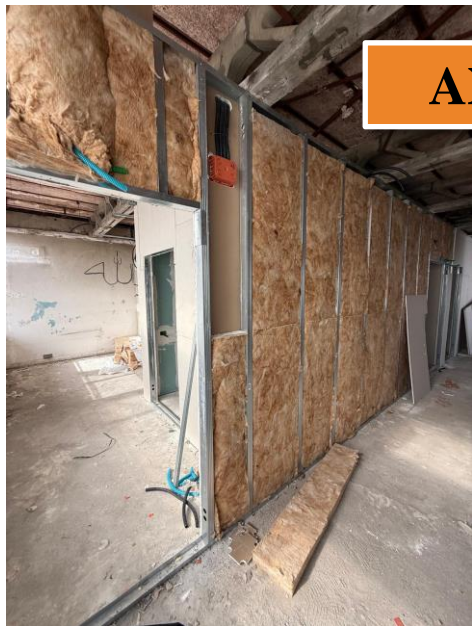

0%

50%

100% LUG 2025





ANDAMENTO LAVORI IV DISTRETTO

CDC HUB VIA DEL FRANTOIO

ANTE OPERAM



ANDAMENTO LAVORI

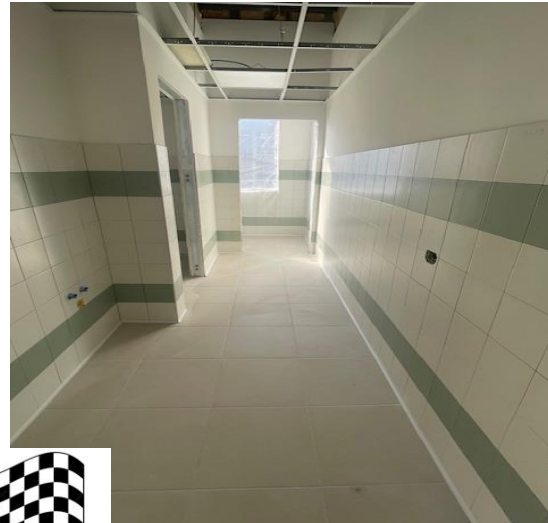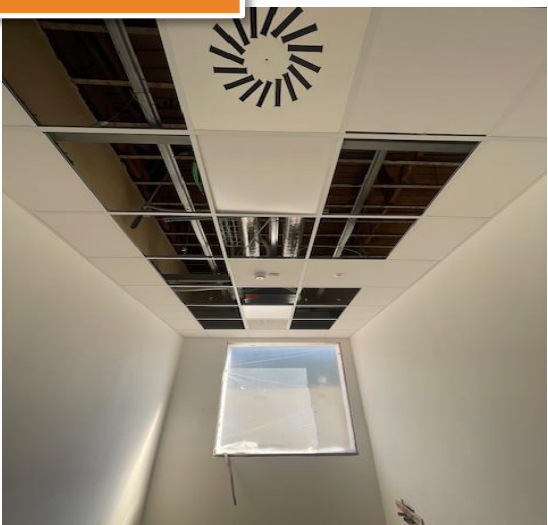

0%

70%

100% MAG 2025



ANDAMENTO LAVORI IV DISTRETTO


CDC HUB BIMBILANDIA

ANTE OPERAM



0%

ANDAMENTO LAVORI



55%



100% GIU 2025


ANDAMENTO LAVORI IV DISTRETTO

CDC HUB VIA MOZART

ANTE OPERAM




ANDAMENTO LAVORI

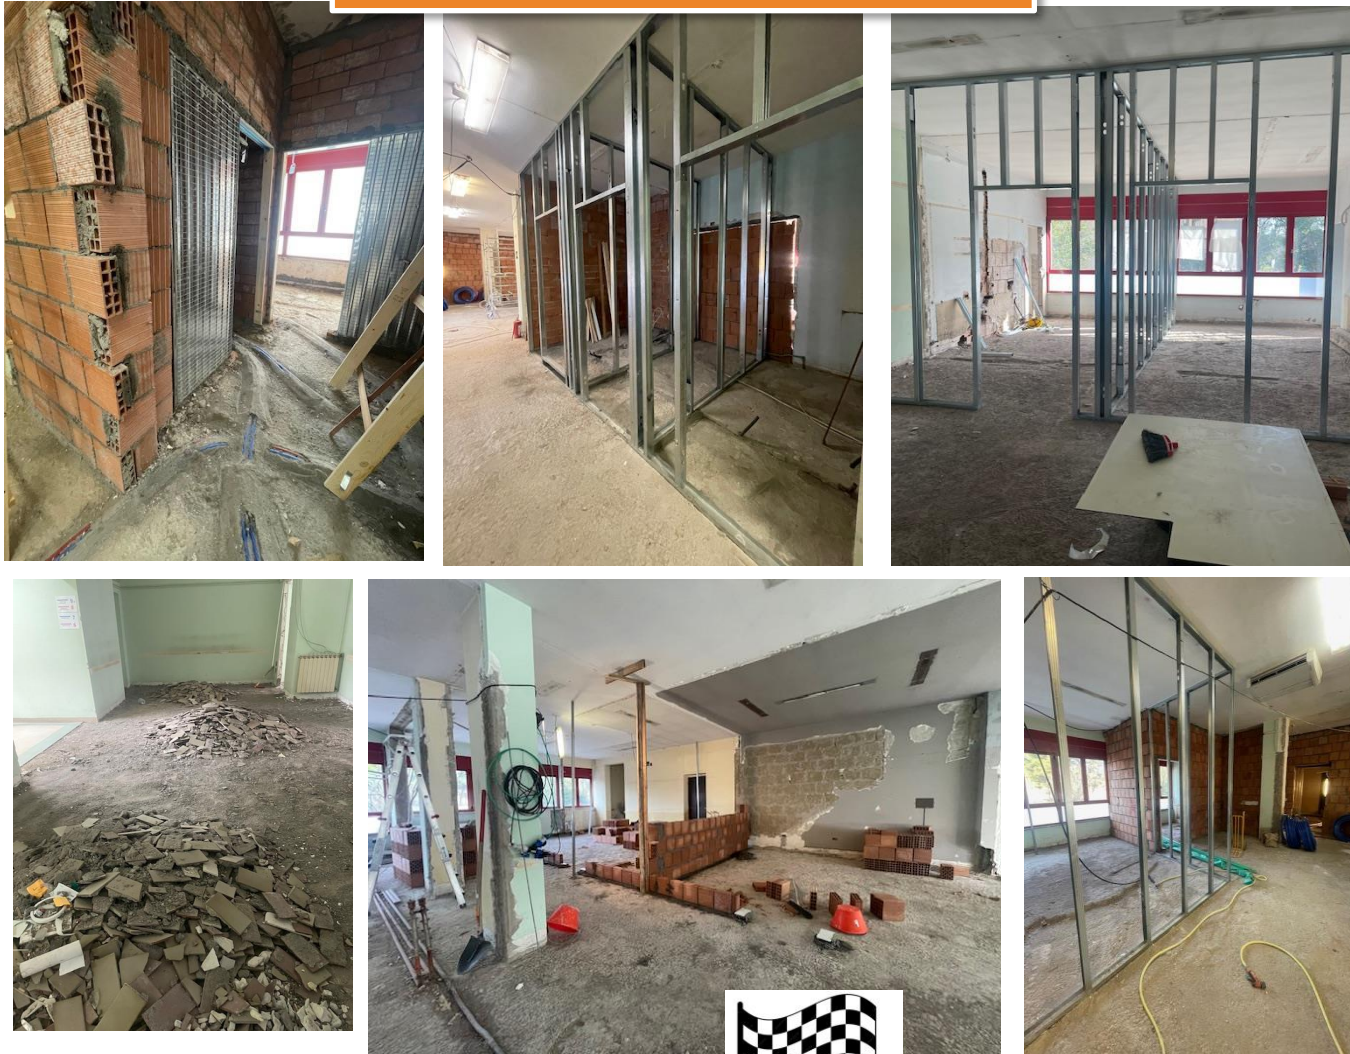

0%

38%




100% LUG 2025

ANDAMENTO LAVORI IV DISTRETTO

CDC HUB VILLA TIBURTINA


ANTE OPERAM



ANDAMENTO LAVORI



0%



43%



100% LUG 2025

ANDAMENTO LAVORI IV DISTRETTO

CDC HUB VIA DI PIETRALATA 497

ANTE OPERAM



ANDAMENTO LAVORI


0%

95%

100% APR 2025



IL PNRR NELL'OSPEDALE SANDRO PERTINI

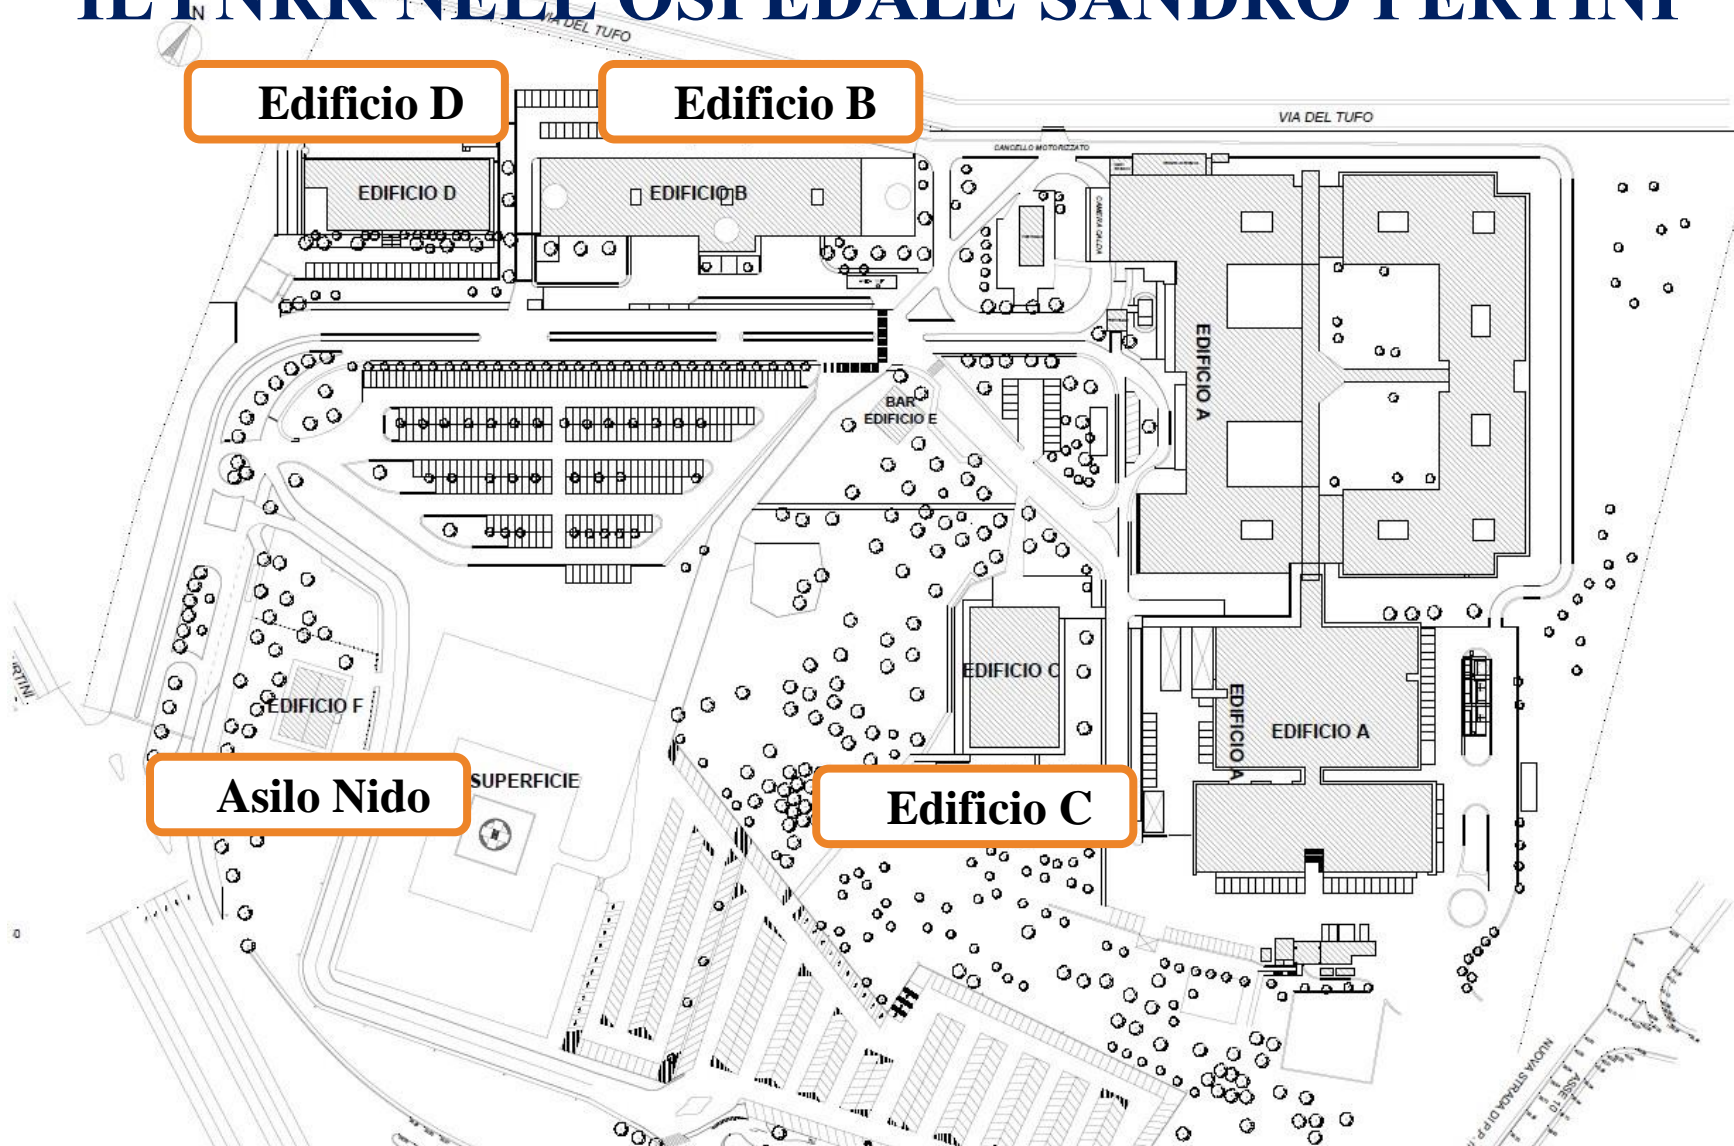

Miglioramento Sismico Palazzina B

Miglioramento Sismico Palazzina C

Miglioramento Sismico Palazzina D

Miglioramento Sismico Asilo Nido

Presidio Ospedaliero	FINE LAVORI
Pertini - Palazzina B	apr-27
Pertini - Palazzina C	dic-25
Pertini - Palazzina D	dic-25
Pertini - Asilo Nido	giu-25
